ID	Task Mode	Task Name	Duration	WBS Predecessors	Predecessors	Start	Finish
1		**Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc**	**96 days**			**Thu 3/5/26**	**Thu 7/16/26**
2		**Khởi động dự án**	**20 days**			**Thu 3/5/26**	**Wed 4/1/26**
3		**Xác định dự án**	**7 days**			**Thu 3/5/26**	**Fri 3/13/26**
4		Xác định nhu cầu của dự án	2 days			Thu 3/5/26	Fri 3/6/26
5		Xác định mục tiêu	1 day	1.1.1.1	4	Mon 3/9/26	Mon 3/9/26
6		Xác định phạm vi	2 days	1.1.1.2	5	Tue 3/10/26	Wed 3/11/26
7		Xác định các stakeholder	1 day	1.1.1.3	6	Thu 3/12/26	Thu 3/12/26
8		Xác định danh sách tài nguyên	1 day	1.1.1.4	7	Fri 3/13/26	Fri 3/13/26
9		**Lập kế hoạch tổng thể**	**13 days**			**Mon 3/16/26**	**Wed 4/1/26**
10		Xây dựng Project Charter	2 days	1.1.1.5	8	Mon 3/16/26	Tue 3/17/26
11		Xây dựng SOW	2 days	1.1.2.1	10	Wed 3/18/26	Thu 3/19/26
12		Xây dựng Business Case	2 days	1.1.2.2	11	Fri 3/20/26	Mon 3/23/26
13		Xây dựng kế hoạch dự án	3 days	1.1.2.3	12	Tue 3/24/26	Thu 3/26/26
14		Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	2 days	1.1.2.4	13	Fri 3/27/26	Mon 3/30/26
15		Xây dựng WBS	2 days	1.1.2.5	14	Tue 3/31/26	Wed 4/1/26
16		**Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống**	**18 days**			**Tue 3/24/26**	**Thu 4/16/26**
17		**Khảo sát hiện trạng**	**8 days**			**Tue 3/24/26**	**Thu 4/2/26**
18		Phỏng vấn khách hàng	3 days	1.1.2.3[SS+2 days]	12SS+2 days	Tue 3/24/26	Thu 3/26/26
19		Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	2 days	1.2.1.1	18	Fri 3/27/26	Mon 3/30/26
20		Phân tích các phương án thực hiện dự án	3 days	1.2.1.2	19	Tue 3/31/26	Thu 4/2/26
21		**Phân tích và thiết kế hệ thống**	**12 days**			**Wed 4/1/26**	**Thu 4/16/26**
22		Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	4 days	1.2.1.3[SS+1 day]	20SS+1 day	Wed 4/1/26	Mon 4/6/26
23		Thiết kế mô hình use case và đặc tả	4 days	1.2.2.1	22	Tue 4/7/26	Fri 4/10/26
24		Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	4 days	1.2.2.2	23	Mon 4/13/26	Thu 4/16/26
25		**Phát triển ứng dụng hệ thống**	**29 days**			**Wed 4/15/26**	**Mon 5/25/26**
26		**Lập trình Front-end**	**22 days**			**Wed 4/15/26**	**Thu 5/14/26**
27		Lựa chọn giao diện dựa trên yêu cầu	3 days	1.2.2.3[SS+2 days]	24SS+2 days	Wed 4/15/26	Fri 4/17/26
28		Xây dựng giao diện đăng nhập	2 days	1.3.1.1	27	Mon 4/20/26	Tue 4/21/26
29		Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý chuỗi cửa	5 days	1.3.1.2	28	Wed 4/22/26	Tue 4/28/26
30		Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý cửa hàng	4 days	1.3.1.3	29	Wed 4/29/26	Mon 5/4/26
31		Xây dựng giao diện Nhân viên bán hàng	4 days	1.3.1.4	30	Tue 5/5/26	Fri 5/8/26
32		Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý kho	4 days	1.3.1.5	31	Mon 5/11/26	Thu 5/14/26
33		**Lập trình Back-end**	**24 days**			**Wed 4/15/26**	**Mon 5/18/26**
34		Xây dựng API đăng nhập	3 days	1.2.2.3[SS+2 days]	24SS+2 days	Wed 4/15/26	Fri 4/17/26
35		Xây dựng API Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	6 days	1.3.2.1	34	Mon 4/20/26	Mon 4/27/26
36		Xây dựng API Nhân viên quản lý cửa hàng	5 days	1.3.2.2	35	Tue 4/28/26	Mon 5/4/26
37		Xây dựng API Nhân viên bán hàng	5 days	1.3.2.3	36	Tue 5/5/26	Mon 5/11/26
38		Xây dựng API Nhân viên quản lý kho	5 days	1.3.2.4	37	Tue 5/12/26	Mon 5/18/26
39		**Tích hợp hệ thống**	**10 days**			**Tue 5/12/26**	**Mon 5/25/26**
40		Kết nối cơ sở dữ liệu	2 days	1.3.1.5,1.3.2.4	31,37	Tue 5/12/26	Wed 5/13/26
41		Tích hợp Front-end và Back-end	3 days	1.3.3.1	40	Thu 5/14/26	Mon 5/18/26
42		Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	2 days	1.3.3.2	41	Tue 5/19/26	Wed 5/20/26
43		Kiểm tra luồng hệ thống	3 days	1.3.3.3	42	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26
44		**Kiểm thử và đánh giá**	**26 days**			**Tue 5/26/26**	**Tue 6/30/26**
45		**Lập kế hoạch kiểm thử**	**7 days**			**Tue 5/26/26**	**Wed 6/3/26**
46		Xác định phạm vi kiểm thử	2 days	1.3.3.4	43	Tue 5/26/26	Wed 5/27/26
47		Xây dựng test case	3 days	1.4.1.1	46	Thu 5/28/26	Mon 6/1/26
48		Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	2 days	1.4.1.2	47	Tue 6/2/26	Wed 6/3/26
49		**Kiểm thử nội bộ**	**10 days**			**Thu 6/4/26**	**Wed 6/17/26**
50		Kiểm thử chức năng từng module	4 days	1.4.1.3	48	Thu 6/4/26	Tue 6/9/26
51		Kiểm thử tích hợp giữa các module	3 days	1.4.2.1	50	Wed 6/10/26	Fri 6/12/26
52		Kiểm tra xử lý dữ liệu	3 days	1.4.2.2	51	Mon 6/15/26	Wed 6/17/26
53		**Kiểm thử người dùng**	**7 days**			**Fri 6/5/26**	**Mon 6/15/26**
54		Chuẩn bị kịch bản kiểm thử	2 days	1.4.2.1[SS+1 day]	50SS+1 day	Fri 6/5/26	Mon 6/8/26
55		Cho người dùng trải nghiệm hệ thống	3 days	1.4.3.1	54	Tue 6/9/26	Thu 6/11/26
56		Thu thập phản hồi và đánh giá	2 days	1.4.3.2	55	Fri 6/12/26	Mon 6/15/26
57		**Khắc phục lỗi và tối ưu**	**9 days**			**Thu 6/18/26**	**Tue 6/30/26**
58		Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	4 days	1.4.2.3,1.4.3.3	52,56	Thu 6/18/26	Tue 6/23/26
59		Tối ưu hiệu năng hệ thống	3 days	1.4.4.1	58	Wed 6/24/26	Fri 6/26/26
60		Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	2 days	1.4.4.2	59	Mon 6/29/26	Tue 6/30/26
61		**Triển khai và bàn giao**	**12 days**			**Wed 7/1/26**	**Thu 7/16/26**
62		**Chuẩn bị triển khai**	**4 days**			**Wed 7/1/26**	**Mon 7/6/26**
63		Chuẩn bị môi trường triển khai	1 day	1.4.4.3	60	Wed 7/1/26	Wed 7/1/26
64		Cấu hình hệ thống	2 days	1.5.1.1	63	Thu 7/2/26	Fri 7/3/26
65		Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	1 day	1.5.1.2	64	Mon 7/6/26	Mon 7/6/26
66		**Triển khai hệ thống**	**3 days**			**Tue 7/7/26**	**Thu 7/9/26**
67		Deploy backend lên môi trường chạy	1 day	1.5.1.3	65	Tue 7/7/26	Tue 7/7/26
68		Deploy frontend	1 day	1.5.2.1	67	Wed 7/8/26	Wed 7/8/26
69		Kiểm tra hệ thống sau triển khai	1 day	1.5.2.2	68	Thu 7/9/26	Thu 7/9/26
70		**Đào tạo và hướng dẫn**	**4 days**			**Thu 7/9/26**	**Tue 7/14/26**
71		Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	2 days	1.5.2.2[SS+1 day]	68SS+1 day	Thu 7/9/26	Fri 7/10/26
72		Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	1 day	1.5.3.1	71	Mon 7/13/26	Mon 7/13/26
73		Giải đáp thắc mắc	1 day	1.5.3.2	72	Tue 7/14/26	Tue 7/14/26
74		**Bàn giao và nghiệm thu**	**2 days**			**Wed 7/15/26**	**Thu 7/16/26**
75		Ký biên bản bàn giao	1 day	1.5.3.3	73	Wed 7/15/26	Wed 7/15/26
76		Họp tổng kết dự án	1 day	1.5.4.1	75	Thu 7/16/26	Thu 7/16/26

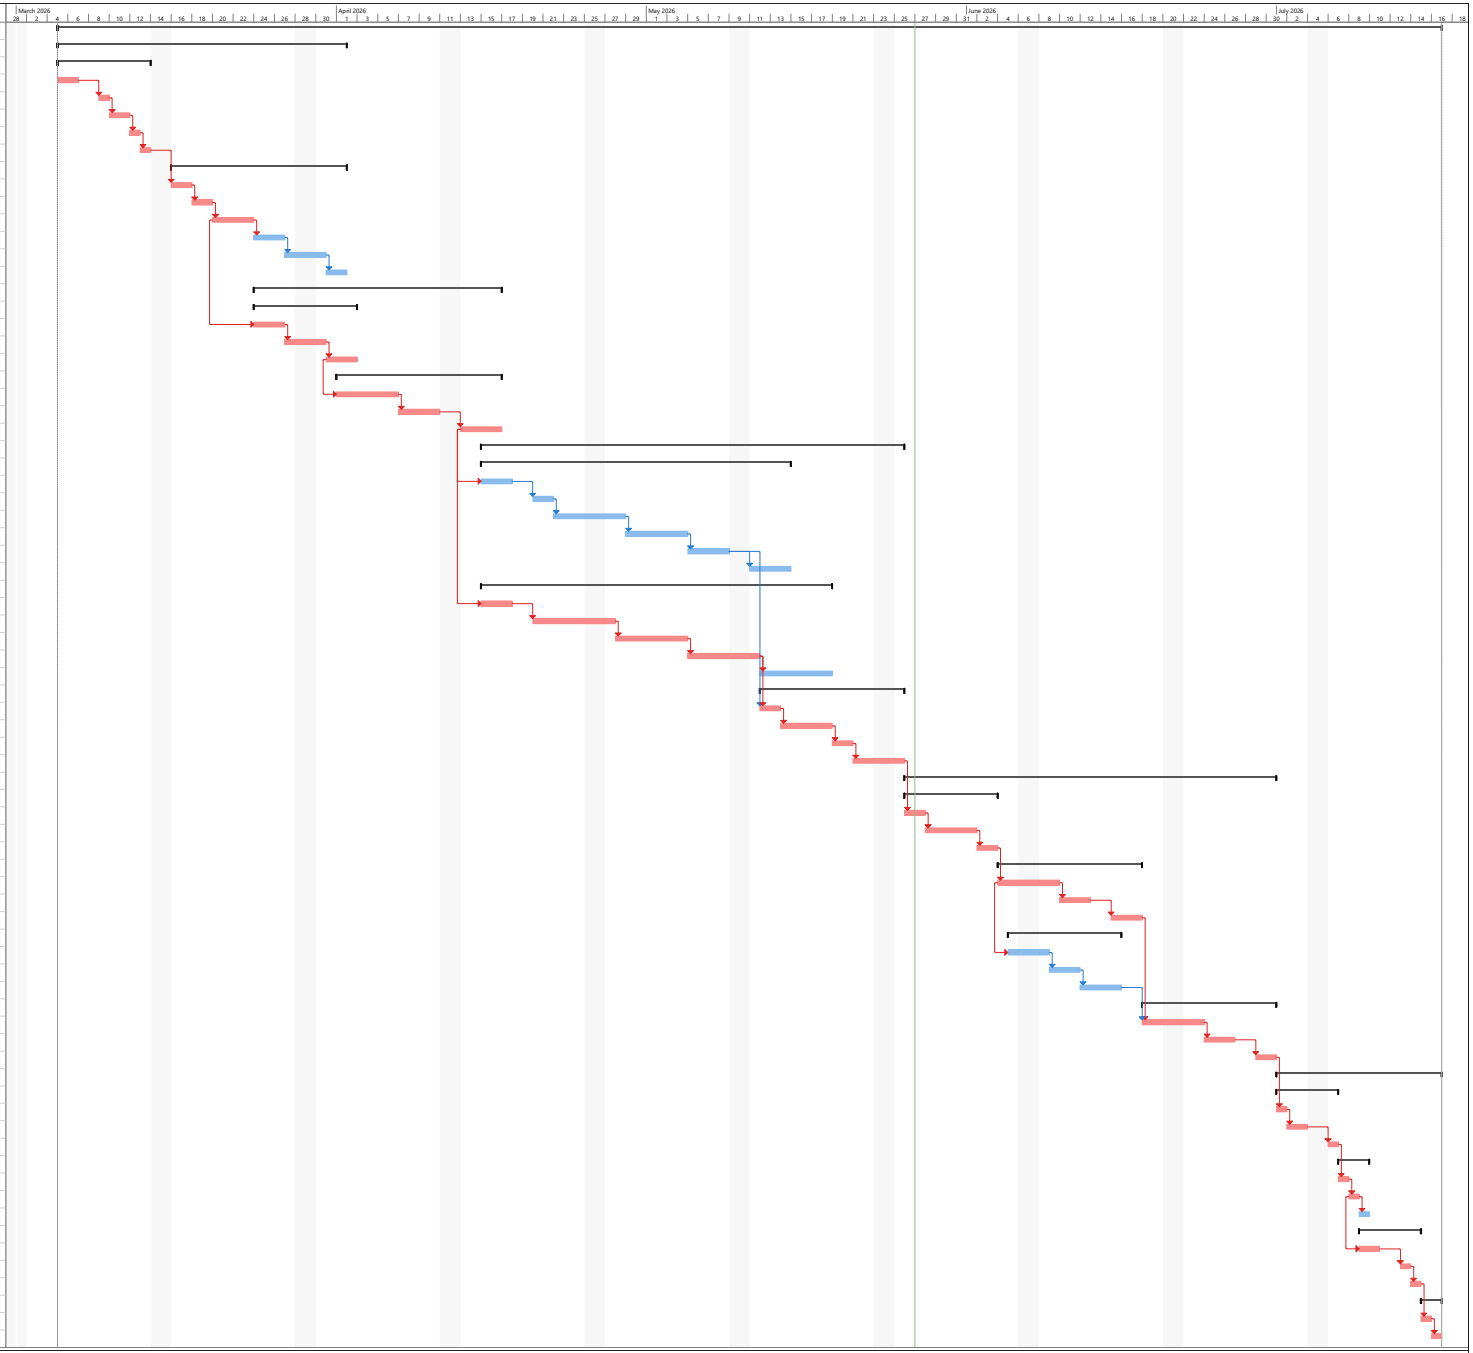

Project: Hệ thống Quản lý chuỗ
Date: Wed 5/27/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress

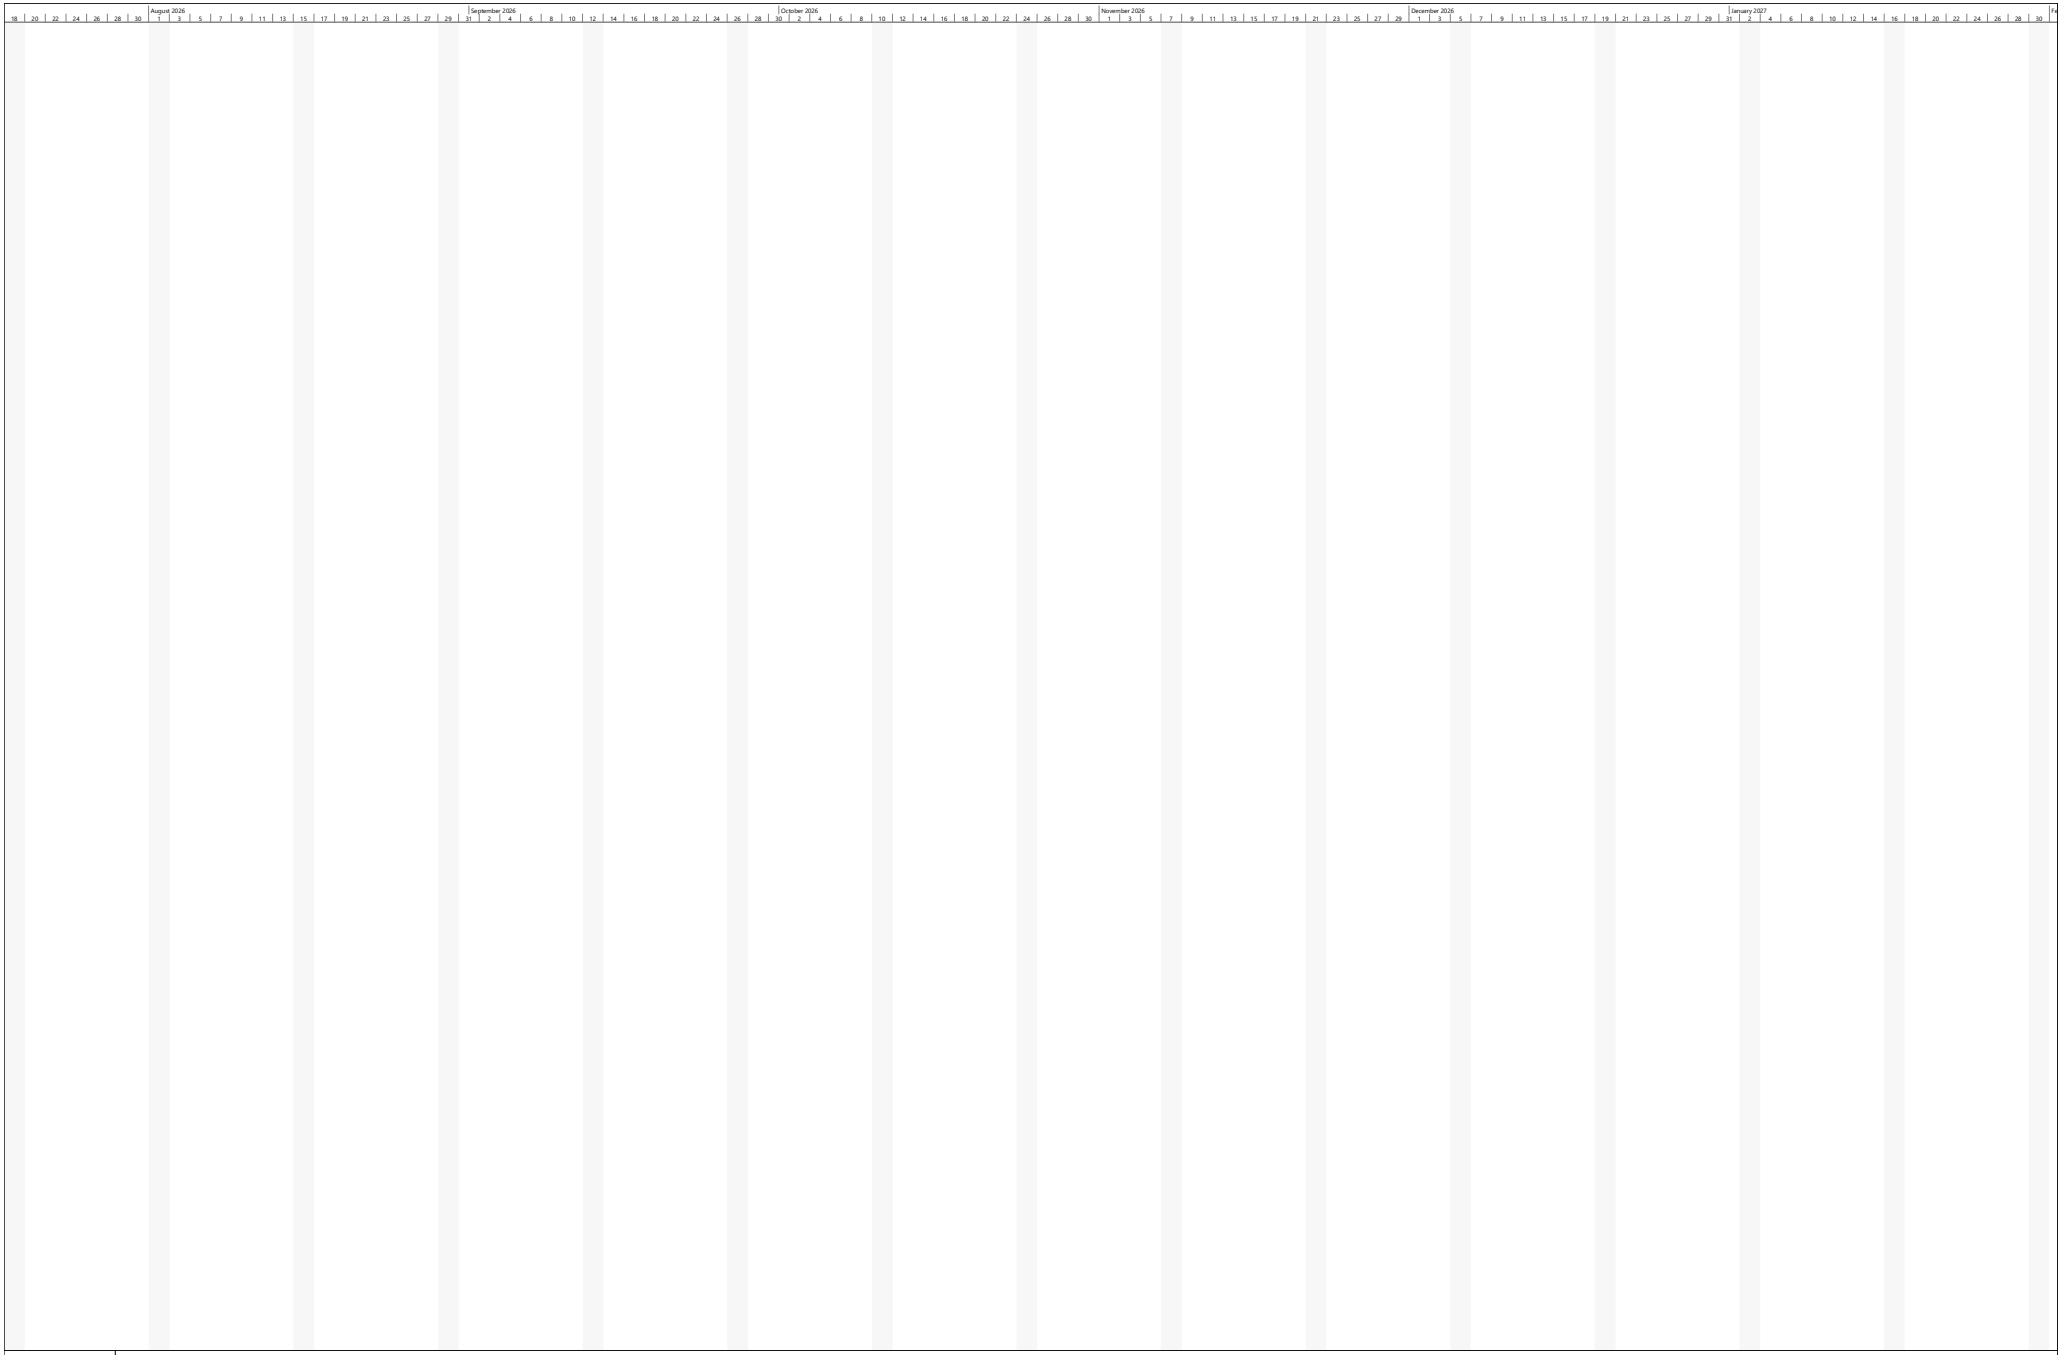

Project: Hệ thống Quản lý chuỗ
Date: Wed 5/27/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress
