ID	Task Name	Duration	Cost	Fixed Cost
1	**Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc**	**96 days**	**654.000.000,00 đ**	**0,00 đ**
2	**Khởi động dự án**	**20 days**	**69.700.000,00 đ**	**0,00 đ**
3	**Xác định dự án**	**7 days**	**24.500.000,00 đ**	**0,00 đ**
4	Xác định nhu cầu của dự án	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
5	Xác định mục tiêu	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
6	Xác định phạm vi	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
7	Xác định các stakeholder	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
8	Xác định danh sách tài nguyên	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
9	**Lập kế hoạch tổng thể**	**13 days**	**45.200.000,00 đ**	**0,00 đ**
10	Xây dựng Project Charter	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
11	Xây dựng SOW	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
12	Xây dựng Business Case	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
13	Xây dựng kế hoạch dự án	3 days	9.000.000,00 đ	0,00 đ
14	Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
15	Xây dựng WBS	2 days	11.200.000,00 đ	0,00 đ
16	**Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống**	**18 days**	**83.300.000,00 đ**	**0,00 đ**
17	**Khảo sát hiện trạng**	**8 days**	**26.500.000,00 đ**	**0,00 đ**
18	Phỏng vấn khách hàng	3 days	10.500.000,00 đ	0,00 đ
19	Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
20	Phân tích các phương án thực hiện dự án	3 days	9.000.000,00 đ	0,00 đ
21	**Phân tích và thiết kế hệ thống**	**12 days**	**56.800.000,00 đ**	**0,00 đ**
22	Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	4 days	12.000.000,00 đ	0,00 đ
23	Thiết kế mô hình use case và đặc tả	4 days	22.400.000,00 đ	0,00 đ
24	Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	4 days	22.400.000,00 đ	0,00 đ
25	**Phát triển ứng dụng hệ thống**	**29 days**	**242.200.000,0...**	**0,00 đ**
26	**Lập trình Front-end**	**22 days**	**123.200.000,0...**	**0,00 đ**
27	Lựa chọn giao diện dựa trên yêu cầu	3 days	16.800.000,00 đ	0,00 đ
28	Xây dựng giao diện đăng nhập	2 days	11.200.000,00 đ	0,00 đ
29	Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý chuỗi cửa	5 days	28.000.000,00 đ	0,00 đ
30	Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý cửa hàng	4 days	22.400.000,00 đ	0,00 đ
31	Xây dựng giao diện Nhân viên bán hàng	4 days	22.400.000,00 đ	0,00 đ
32	Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý kho	4 days	22.400.000,00 đ	0,00 đ
33	**Lập trình Back-end**	**24 days**	**84.000.000,00 đ**	**0,00 đ**
34	Xây dựng API đăng nhập	3 days	10.500.000,00 đ	0,00 đ
35	Xây dựng API Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	6 days	21.000.000,00 đ	0,00 đ
36	Xây dựng API Nhân viên quản lý cửa hàng	5 days	17.500.000,00 đ	0,00 đ
37	Xây dựng API Nhân viên bán hàng	5 days	17.500.000,00 đ	0,00 đ
38	Xây dựng API Nhân viên quản lý kho	5 days	17.500.000,00 đ	0,00 đ
39	**Tích hợp hệ thống**	**10 days**	**35.000.000,00 đ**	**0,00 đ**
40	Kết nối cơ sở dữ liệu	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
41	Tích hợp Front-end và Back-end	3 days	10.500.000,00 đ	0,00 đ
42	Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
43	Kiểm tra luồng hệ thống	3 days	10.500.000,00 đ	0,00 đ
44	**Kiểm thử và đánh giá**	**26 days**	**107.700.000,0...**	**0,00 đ**
45	**Lập kế hoạch kiểm thử**	**7 days**	**21.000.000,00 đ**	**0,00 đ**
46	Xác định phạm vi kiểm thử	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
47	Xây dựng test case	3 days	9.000.000,00 đ	0,00 đ
48	Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
49	**Kiểm thử nội bộ**	**10 days**	**30.000.000,00 đ**	**0,00 đ**
50	Kiểm thử chức năng từng module	4 days	12.000.000,00 đ	0,00 đ
51	Kiểm thử tích hợp giữa các module	3 days	9.000.000,00 đ	0,00 đ
52	Kiểm tra xử lý dữ liệu	3 days	9.000.000,00 đ	0,00 đ
53	**Kiểm thử người dùng**	**7 days**	**21.000.000,00 đ**	**0,00 đ**
54	Chuẩn bị kịch bản kiểm thử	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
55	Cho người dùng trải nghiệm hệ thống	3 days	9.000.000,00 đ	0,00 đ
56	Thu thập phản hồi và đánh giá	2 days	6.000.000,00 đ	0,00 đ
57	**Khắc phục lỗi và tối ưu**	**9 days**	**35.700.000,00 đ**	**0,00 đ**
58	Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	4 days	14.000.000,00 đ	0,00 đ
59	Tối ưu hiệu năng hệ thống	3 days	10.500.000,00 đ	0,00 đ
60	Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	2 days	11.200.000,00 đ	0,00 đ
61	**Triển khai và bàn giao**	**12 days**	**151.100.000,0...**	**0,00 đ**
62	**Chuẩn bị triển khai**	**4 days**	**107.000.000,0...**	**0,00 đ**
63	Chuẩn bị môi trường triển khai	1 day	96.500.000,00 đ	93.000.000,0...
64	Cấu hình hệ thống	2 days	7.000.000,00 đ	0,00 đ
65	Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
66	**Triển khai hệ thống**	**3 days**	**10.500.000,00 đ**	**0,00 đ**
67	Deploy backend lên môi trường chạy	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
68	Deploy frontend	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
69	Kiểm tra hệ thống sau triển khai	1 day	3.500.000,00 đ	0,00 đ
70	**Đào tạo và hướng dẫn**	**4 days**	**22.400.000,00 đ**	**0,00 đ**
71	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	2 days	11.200.000,00 đ	0,00 đ
72	Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	1 day	5.600.000,00 đ	0,00 đ
73	Giải đáp thắc mắc	1 day	5.600.000,00 đ	0,00 đ
74	**Bàn giao và nghiệm thu**	**2 days**	**11.200.000,00 đ**	**0,00 đ**
75	Ký biên bản bàn giao	1 day	5.600.000,00 đ	0,00 đ
76	Họp tổng kết dự án	1 day	5.600.000,00 đ	0,00 đ

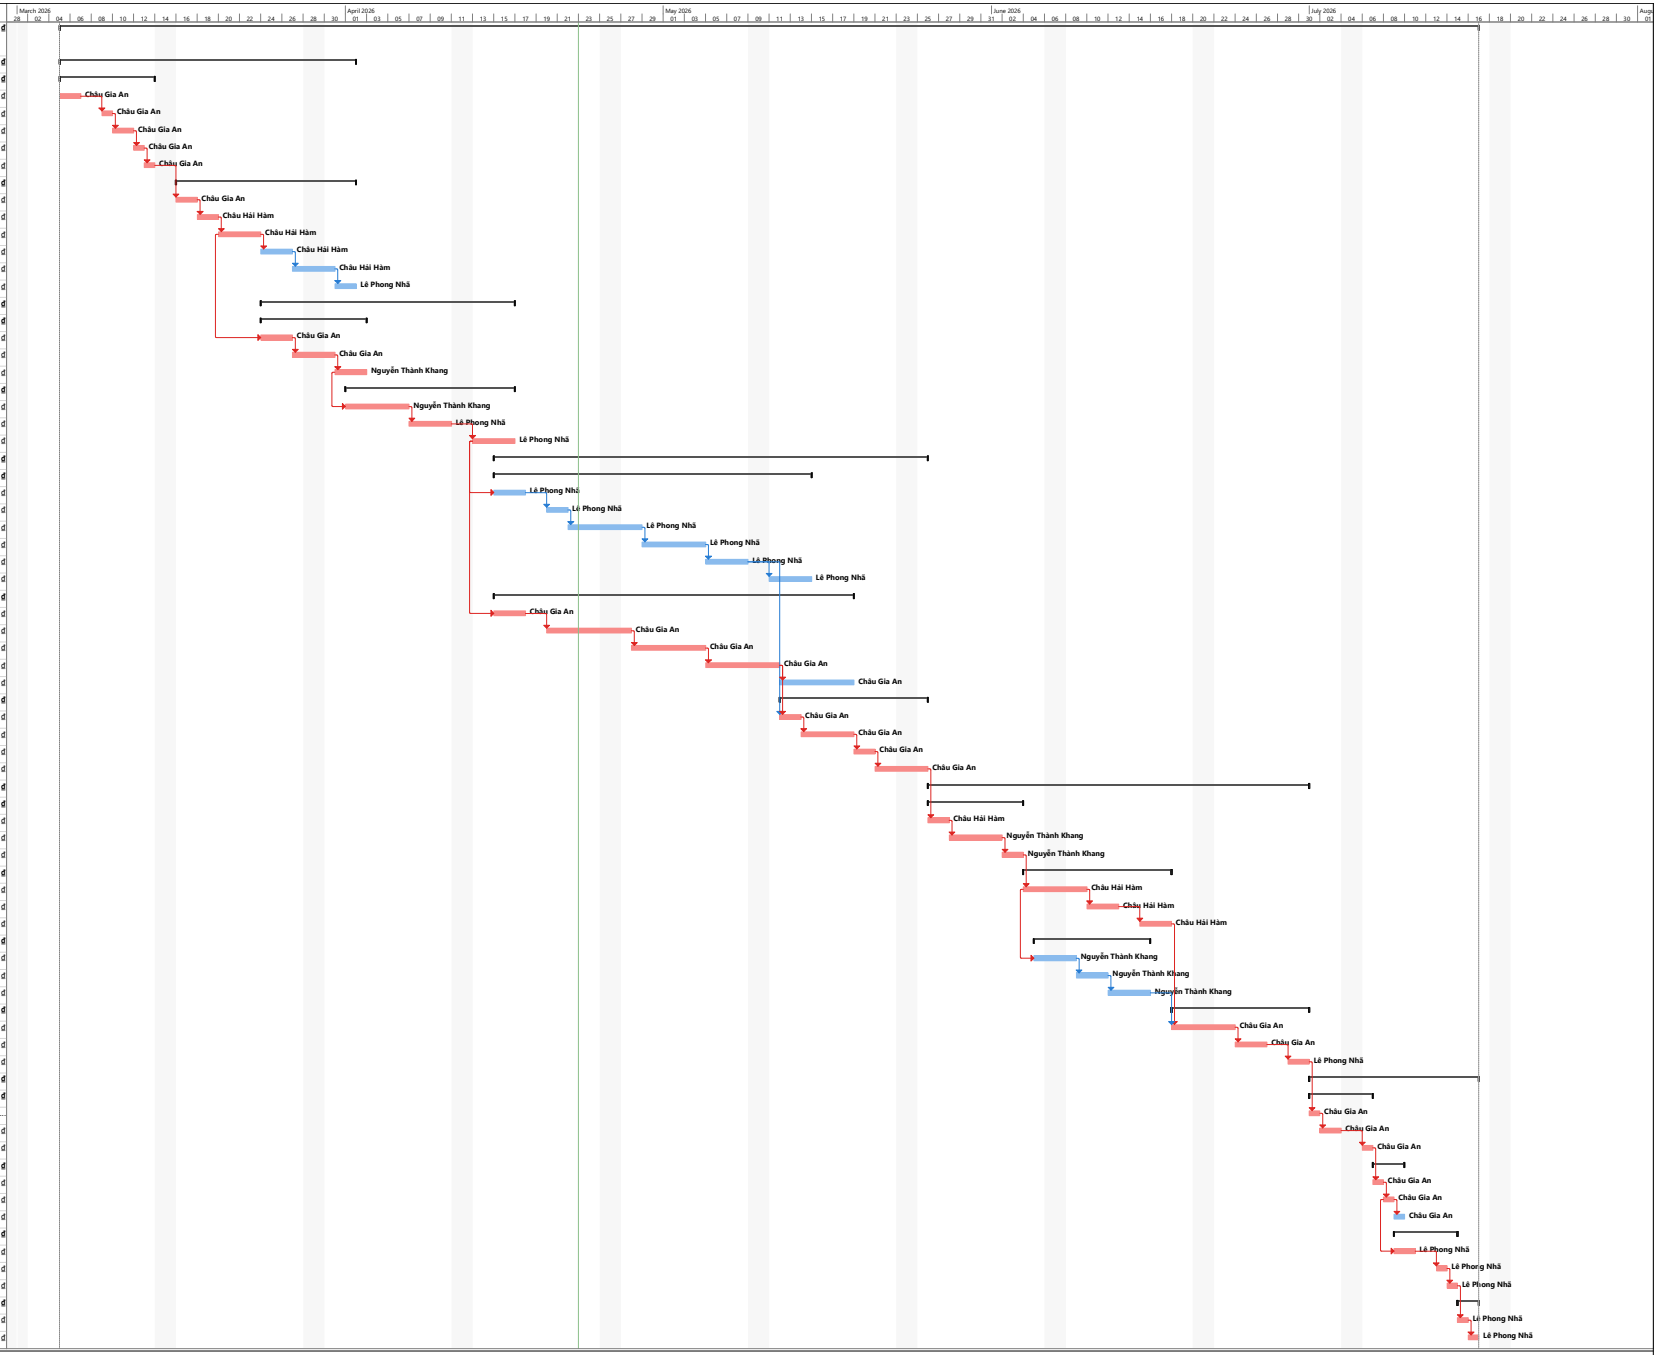

Project: Hệ thống Quản lý chuỗ
Date: Thu 23/04/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress
