ID	Task Mode	Task Name	Duration	WBS Predecessors	Predecessors	Start	Finish
1		**Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc**	**96 days**			**Thu 05/03/26**	**Thu 16/07/26**
2		**Khởi động dự án**	**20 days**			**Thu 05/03/26**	**Wed 01/04/26**
3		**Xác định dự án**	**7 days**			**Thu 05/03/26**	**Fri 13/03/26**
4		Xác định nhu cầu của dự án	2 days			Thu 05/03/26	Fri 06/03/26
5		Xác định mục tiêu	1 day	1.1.1.1	4	Mon 09/03/26	Mon 09/03/26
6		Xác định phạm vi	2 days	1.1.1.2	5	Tue 10/03/26	Wed 11/03/26
7		Xác định các stakeholder	1 day	1.1.1.3	6	Thu 12/03/26	Thu 12/03/26
8		Xác định danh sách tài nguyên	1 day	1.1.1.4	7	Fri 13/03/26	Fri 13/03/26
9		**Lập kế hoạch tổng thể**	**13 days**			**Mon 16/03/26**	**Wed 01/04/26**
10		Xây dựng Project Charter	2 days	1.1.1.5	8	Mon 16/03/26	Tue 17/03/26
11		Xây dựng SOW	2 days	1.1.2.1	10	Wed 18/03/26	Thu 19/03/26
12		Xây dựng Business Case	2 days	1.1.2.2	11	Fri 20/03/26	Mon 23/03/26
13		Xây dựng kế hoạch dự án	3 days	1.1.2.3	12	Tue 24/03/26	Thu 26/03/26
14		Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	2 days	1.1.2.4	13	Fri 27/03/26	Mon 30/03/26
15		Xây dựng WBS	2 days	1.1.2.5	14	Tue 31/03/26	Wed 01/04/26
16		**Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống**	**18 days**			**Tue 24/03/26**	**Thu 16/04/26**
17		**Khảo sát hiện trạng**	**8 days**			**Tue 24/03/26**	**Thu 02/04/26**
18		Phỏng vấn khách hàng	3 days	1.1.2.3[SS+2 days]	12SS+2 days	Tue 24/03/26	Thu 26/03/26
19		Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	2 days	1.2.1.1	18	Fri 27/03/26	Mon 30/03/26
20		Phân tích các phương án thực hiện dự án	3 days	1.2.1.2	19	Tue 31/03/26	Thu 02/04/26
21		**Phân tích và thiết kế hệ thống**	**12 days**			**Wed 01/04/26**	**Thu 16/04/26**
22		Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	4 days	1.2.1.3[SS+1 day]	20SS+1 day	Wed 01/04/26	Mon 06/04/26
23		Thiết kế mô hình use case và đặc tả	4 days	1.2.2.1	22	Tue 07/04/26	Fri 10/04/26
24		Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	4 days	1.2.2.2	23	Mon 13/04/26	Thu 16/04/26
25		**Phát triển ứng dụng hệ thống**	**29 days**			**Wed 15/04/26**	**Mon 25/05/26**
26		**Lập trình Front-end**	**22 days**			**Wed 15/04/26**	**Thu 14/05/26**
27		Lựa chọn giao diện dựa trên yêu cầu	3 days	1.2.2.3[SS+2 days]	24SS+2 days	Wed 15/04/26	Fri 17/04/26
28		Xây dựng giao diện đăng nhập	2 days	1.3.1.1	27	Mon 20/04/26	Tue 21/04/26
29		Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý chuỗi cửa	5 days	1.3.1.2	28	Wed 22/04/26	Tue 28/04/26
30		Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý cửa hàng	4 days	1.3.1.3	29	Wed 29/04/26	Mon 04/05/26
31		Xây dựng giao diện Nhân viên bán hàng	4 days	1.3.1.4	30	Tue 05/05/26	Fri 08/05/26
32		Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý kho	4 days	1.3.1.5	31	Mon 11/05/26	Thu 14/05/26
33		**Lập trình Back-end**	**24 days**			**Wed 15/04/26**	**Mon 18/05/26**
34		Xây dựng API đăng nhập	3 days	1.2.2.3[SS+2 days]	24SS+2 days	Wed 15/04/26	Fri 17/04/26
35		Xây dựng API Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	6 days	1.3.2.1	34	Mon 20/04/26	Mon 27/04/26
36		Xây dựng API Nhân viên quản lý cửa hàng	5 days	1.3.2.2	35	Tue 28/04/26	Mon 04/05/26
37		Xây dựng API Nhân viên bán hàng	5 days	1.3.2.3	36	Tue 05/05/26	Mon 11/05/26
38		Xây dựng API Nhân viên quản lý kho	5 days	1.3.2.4	37	Tue 12/05/26	Mon 18/05/26
39		**Tích hợp hệ thống**	**10 days**			**Tue 12/05/26**	**Mon 25/05/26**
40		Kết nối cơ sở dữ liệu	2 days	1.3.1.5,1.3.2.4	31,37	Tue 12/05/26	Wed 13/05/26
41		Tích hợp Front-end và Back-end	3 days	1.3.3.1	40	Thu 14/05/26	Mon 18/05/26
42		Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	2 days	1.3.3.2	41	Tue 19/05/26	Wed 20/05/26
43		Kiểm tra luồng hệ thống	3 days	1.3.3.3	42	Thu 21/05/26	Mon 25/05/26
44		**Kiểm thử và đánh giá**	**26 days**			**Tue 26/05/26**	**Tue 30/06/26**
45		**Lập kế hoạch kiểm thử**	**7 days**			**Tue 26/05/26**	**Wed 03/06/26**
46		Xác định phạm vi kiểm thử	2 days	1.3.3.4	43	Tue 26/05/26	Wed 27/05/26
47		Xây dựng test case	3 days	1.4.1.1	46	Thu 28/05/26	Mon 01/06/26
48		Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	2 days	1.4.1.2	47	Tue 02/06/26	Wed 03/06/26
49		**Kiểm thử nội bộ**	**10 days**			**Thu 04/06/26**	**Wed 17/06/26**
50		Kiểm thử chức năng từng module	4 days	1.4.1.3	48	Thu 04/06/26	Tue 09/06/26
51		Kiểm thử tích hợp giữa các module	3 days	1.4.2.1	50	Wed 10/06/26	Fri 12/06/26
52		Kiểm tra xử lý dữ liệu	3 days	1.4.2.2	51	Mon 15/06/26	Wed 17/06/26
53		**Kiểm thử người dùng**	**7 days**			**Fri 05/06/26**	**Mon 15/06/26**
54		Chuẩn bị kịch bản kiểm thử	2 days	1.4.2.1[SS+1 day]	50SS+1 day	Fri 05/06/26	Mon 08/06/26
55		Cho người dùng trải nghiệm hệ thống	3 days	1.4.3.1	54	Tue 09/06/26	Thu 11/06/26
56		Thu thập phản hồi và đánh giá	2 days	1.4.3.2	55	Fri 12/06/26	Mon 15/06/26
57		**Khắc phục lỗi và tối ưu**	**9 days**			**Thu 18/06/26**	**Tue 30/06/26**
58		Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	4 days	1.4.2.3,1.4.3.3	52,56	Thu 18/06/26	Tue 23/06/26
59		Tối ưu hiệu năng hệ thống	3 days	1.4.4.1	58	Wed 24/06/26	Fri 26/06/26
60		Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	2 days	1.4.4.2	59	Mon 29/06/26	Tue 30/06/26
61		**Triển khai và bàn giao**	**12 days**			**Wed 01/07/26**	**Thu 16/07/26**
62		**Chuẩn bị triển khai**	**4 days**			**Wed 01/07/26**	**Mon 06/07/26**
63		Chuẩn bị môi trường triển khai	1 day	1.4.4.3	60	Wed 01/07/26	Wed 01/07/26
64		Cấu hình hệ thống	2 days	1.5.1.1	63	Thu 02/07/26	Fri 03/07/26
65		Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	1 day	1.5.1.2	64	Mon 06/07/26	Mon 06/07/26
66		**Triển khai hệ thống**	**3 days**			**Tue 07/07/26**	**Thu 09/07/26**
67		Deploy backend lên môi trường chạy	1 day	1.5.1.3	65	Tue 07/07/26	Tue 07/07/26
68		Deploy frontend	1 day	1.5.2.1	67	Wed 08/07/26	Wed 08/07/26
69		Kiểm tra hệ thống sau triển khai	1 day	1.5.2.2	68	Thu 09/07/26	Thu 09/07/26
70		**Đào tạo và hướng dẫn**	**4 days**			**Thu 09/07/26**	**Tue 14/07/26**
71		Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	2 days	1.5.2.2[SS+1 day]	68SS+1 day	Thu 09/07/26	Fri 10/07/26
72		Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	1 day	1.5.3.1	71	Mon 13/07/26	Mon 13/07/26
73		Giải đáp thắc mắc	1 day	1.5.3.2	72	Tue 14/07/26	Tue 14/07/26
74		**Bàn giao và nghiệm thu**	**2 days**			**Wed 15/07/26**	**Thu 16/07/26**
75		Ký biên bản bàn giao	1 day	1.5.3.3	73	Wed 15/07/26	Wed 15/07/26
76		Họp tổng kết dự án	1 day	1.5.4.1	75	Thu 16/07/26	Thu 16/07/26

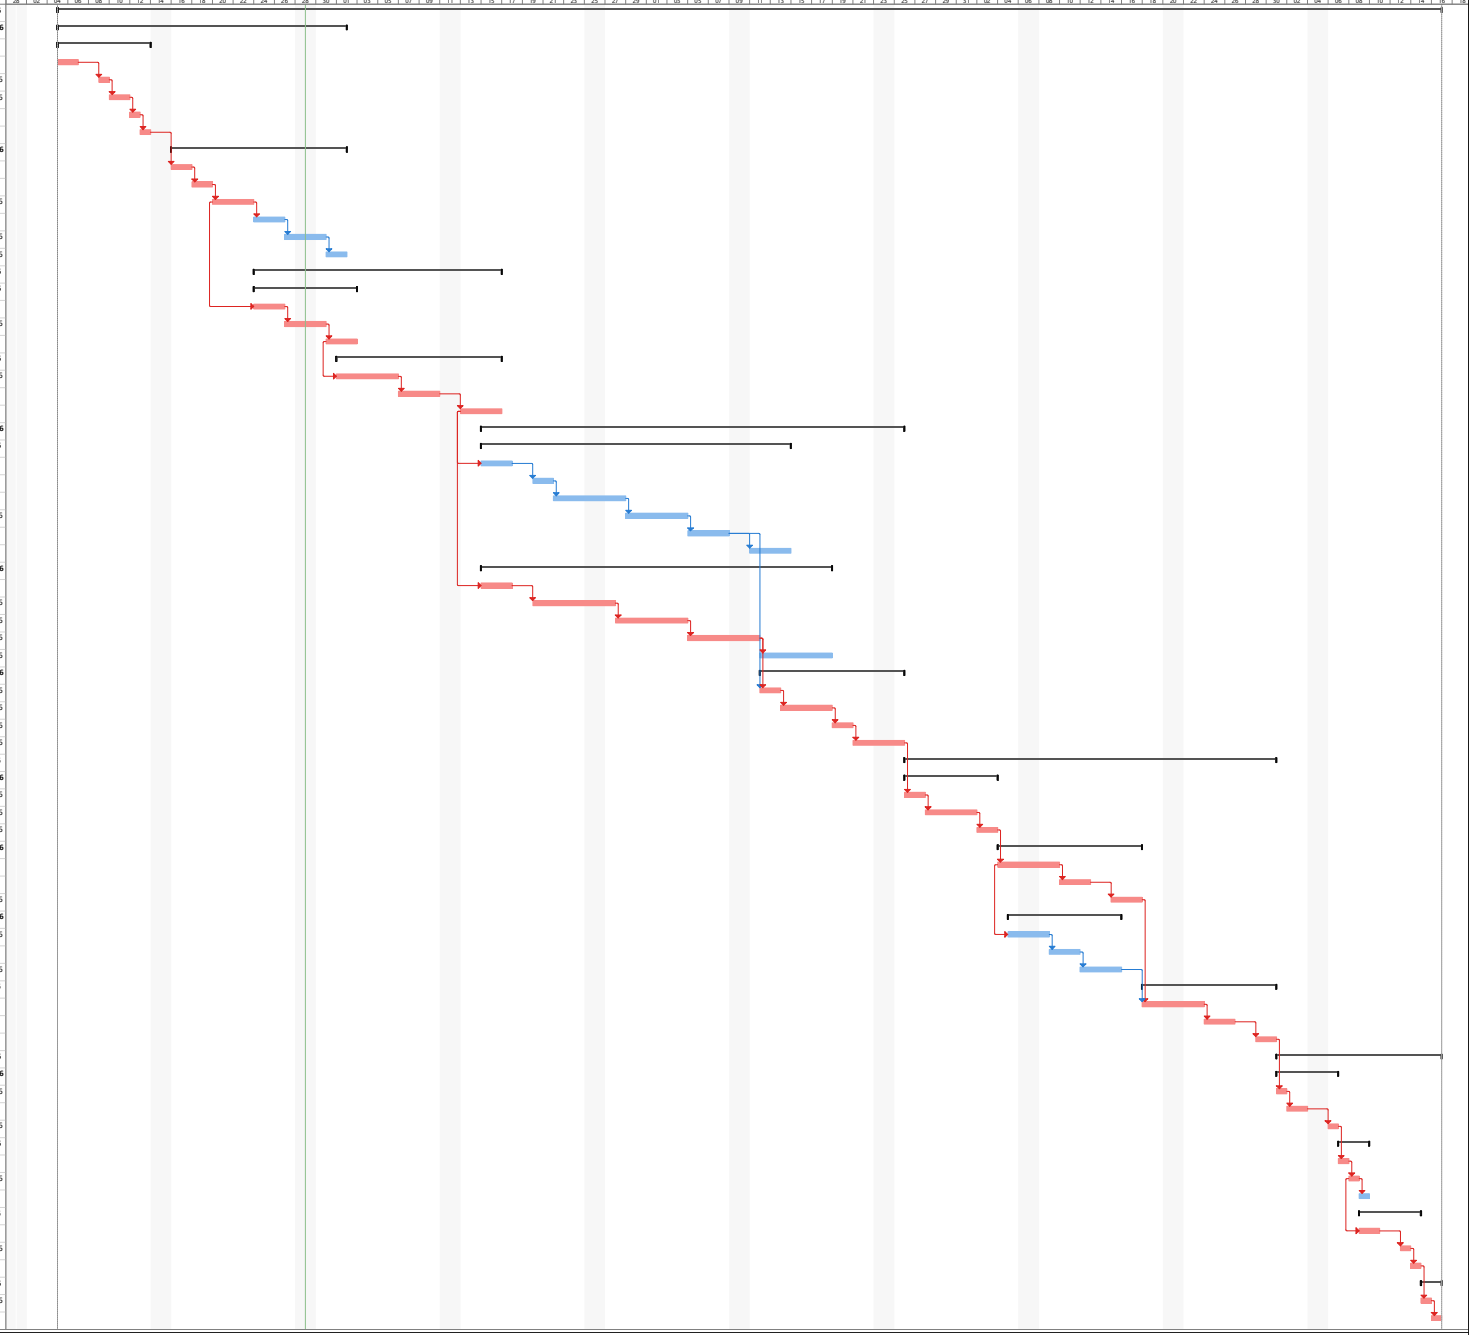

Project: Hệ thống Quản lý chuỗ
Date: Sun 29/03/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Critical | Critical Split | Progress | Manual Progress
